

PROGETTO:

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA COMUNALE ALLO SVINCOLO SAN
TEODORO-CAMPO SPORTIVO

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

VISTO UTC

I TECNICI

Ing. Francesco CORSINI

Geom. Michele CHIRICO



TAV. N°

15

SCALA


DATA

Febbraio 2018

AGG.

DURATA (gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	01/02/2019	01/02/2019	0
2	B	Scavi, demolizioni e trasporti a rifiuti	02/02/2019	12/02/2019	10
3	C	opere d'arte	13/02/2019	04/04/2019	50
4	D	pavimentazione stradale	05/04/2019	13/04/2019	8
5	E	barriere di sicurezza	14/04/2019	24/04/2019	10
6	F	ingegneria naturalistica	25/04/2019	20/05/2019	25
7	G	segnaletica	21/05/2019	31/05/2019	10
9	H	Fine lavori	01/06/2019	01/06/2019	0

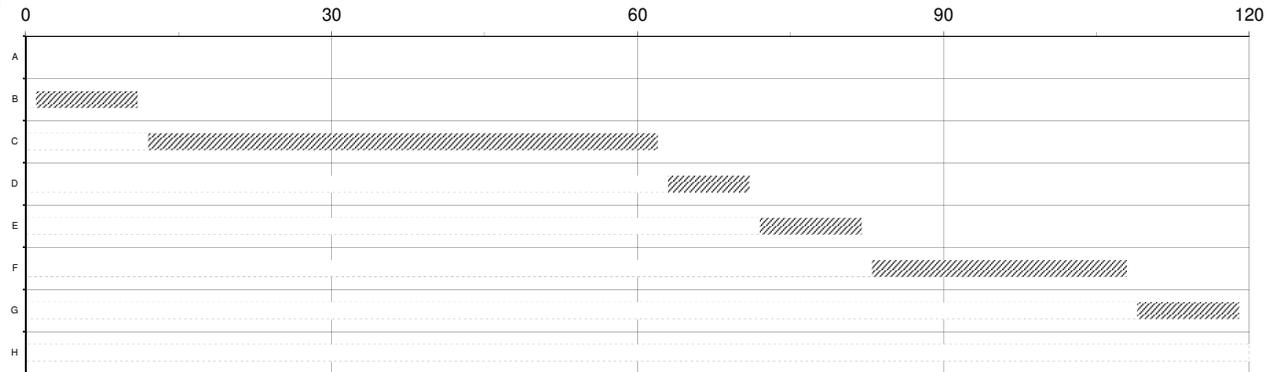

Inizio dei lavori
0 gg

Fine lavori
120 gg

TC **120** gg.
naturali consecutivi
